

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO_V- 24.05.2801**

Posizione

Deposito Voltabarozzo

Data mis.: 28/05/2024

Ora inizio: 15:47:44

Ora fine: 17:27:47

Durata: 6003.7 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 23°C

Precipitazioni: /

Umidità: 54%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 59.0 dBA

Max = 77.3 dBA

L50 = 56.6 dBA

Min = 49.5 dBA




L10 = 60.2 dBA

L95 = 53.4 dBA

Attività di cantiere: **scavi e spianamenti con escavatori e pale gommate**

Eventi generati dal cantiere: **nessuno**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

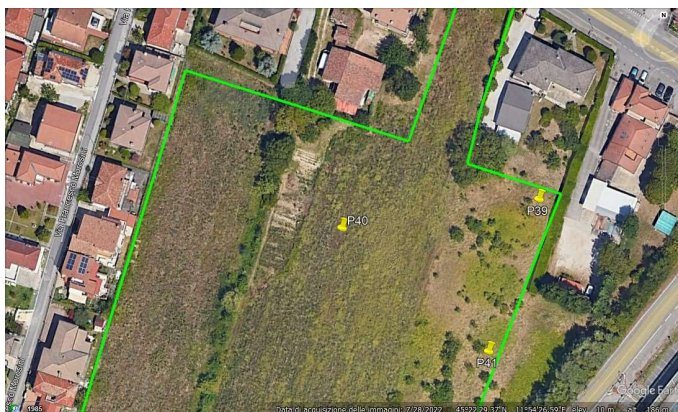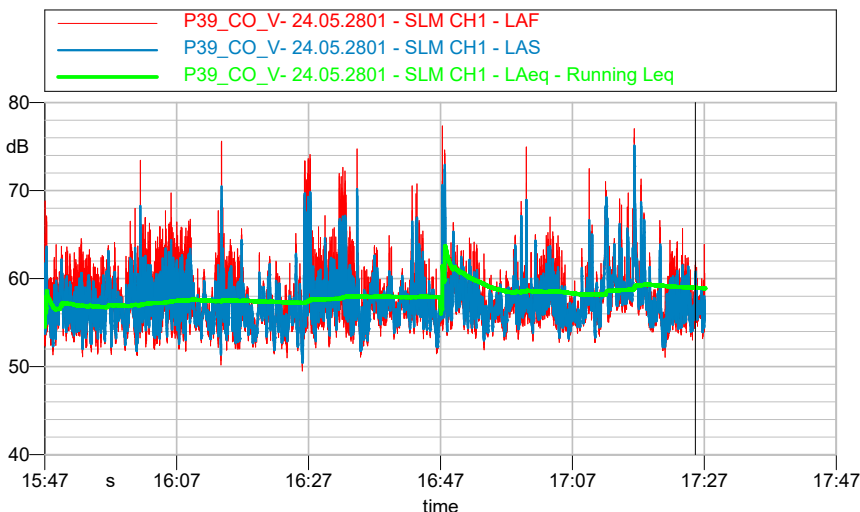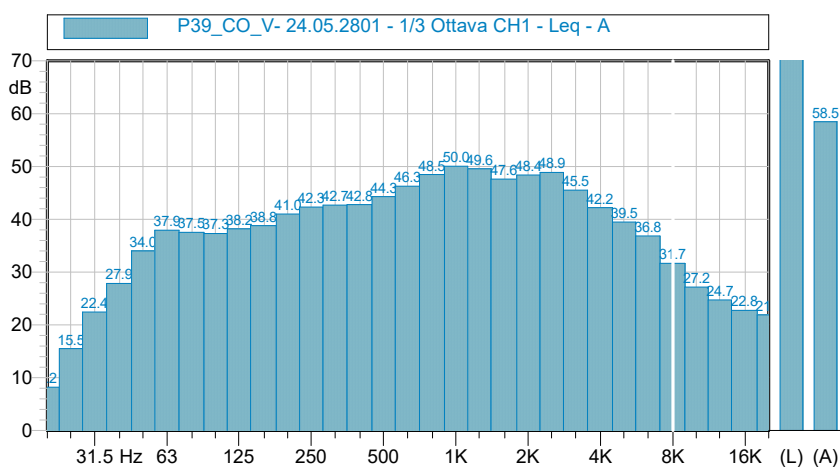

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
58.9 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
