

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P8-CO-V\_24.05.14\_assi

Microcantiere: D1 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Via Morgagni civ.5

Data misura: 14/05/2024 Durata: 7704.8 sec Temperatura: 27°C

Ora inizio: 14:13:09 Precipitazioni: / Umidità: 78%

Ora fine: 16:21:33 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat,  
posa cavidotti e scarifica terreno

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

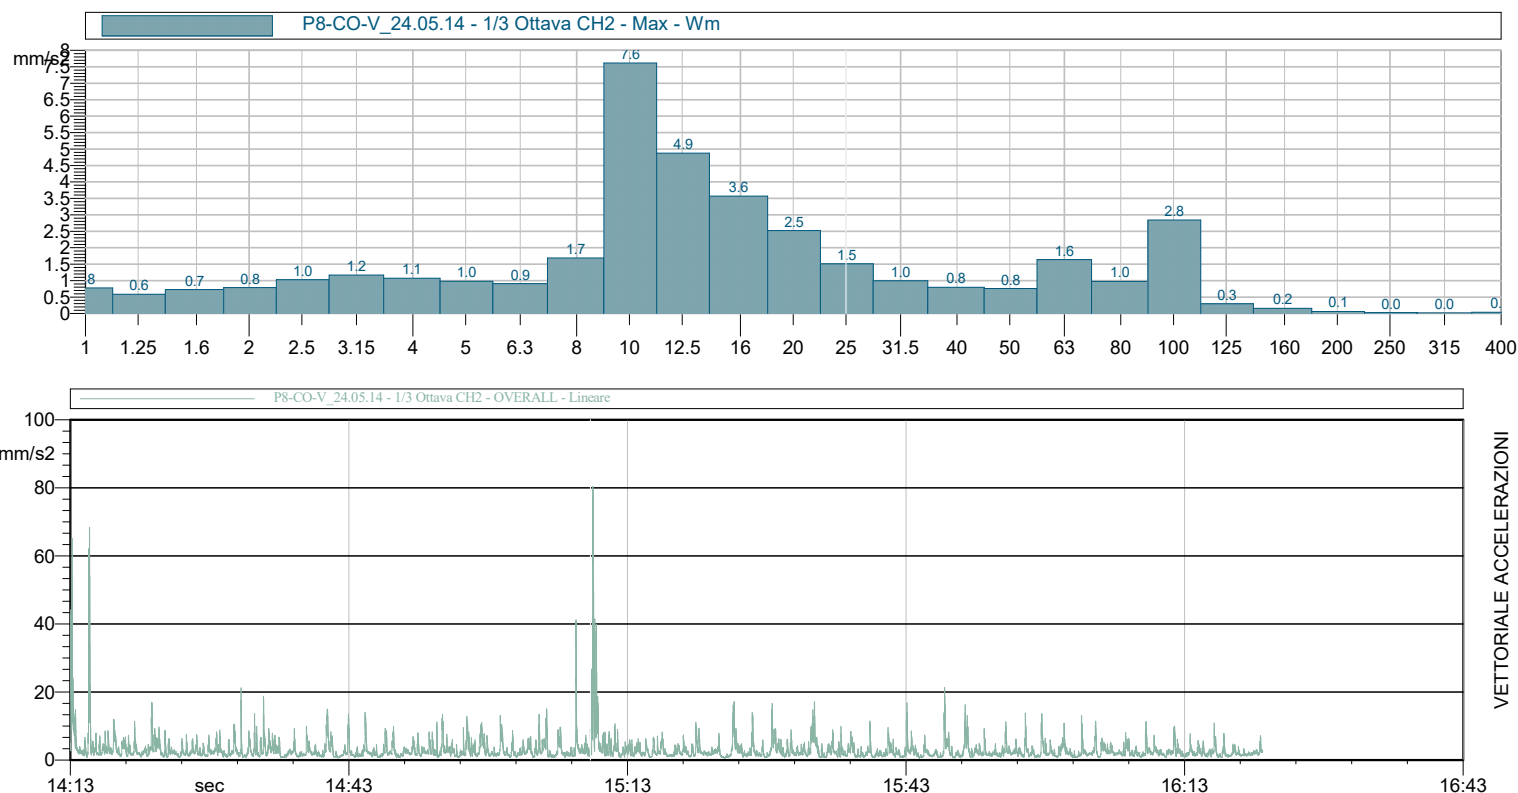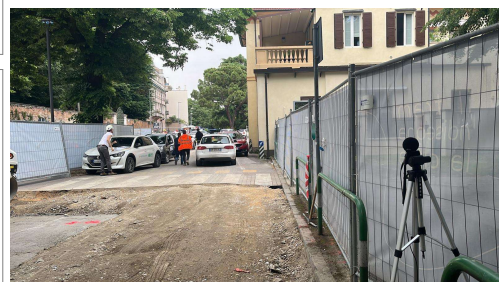

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

0.7 mm/s²

VALORE MISURATO  
aw,95

4.4 mm/s²

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
