

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P34BIS\_CO\_R-24.06.11**

Posizione

**piazzetta con statua**

Data mis.: 11/06/2024

Ora inizio: 15:45:41

Ora fine: 16:15:41

Durata: 1800.0 sec

Microcantiere: **L6**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 21°C

Precipitazioni: /

Umidità: 65%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 61. dBA

Max = 77.6dBA

L50 = 59.7 dBA

Min = 46.2 dBA




L10 = 64.4 dBA

L95 = 49.6 dBA

Attività di cantiere: **nessuna**

Eventi generati dal cantiere: **nessuno**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

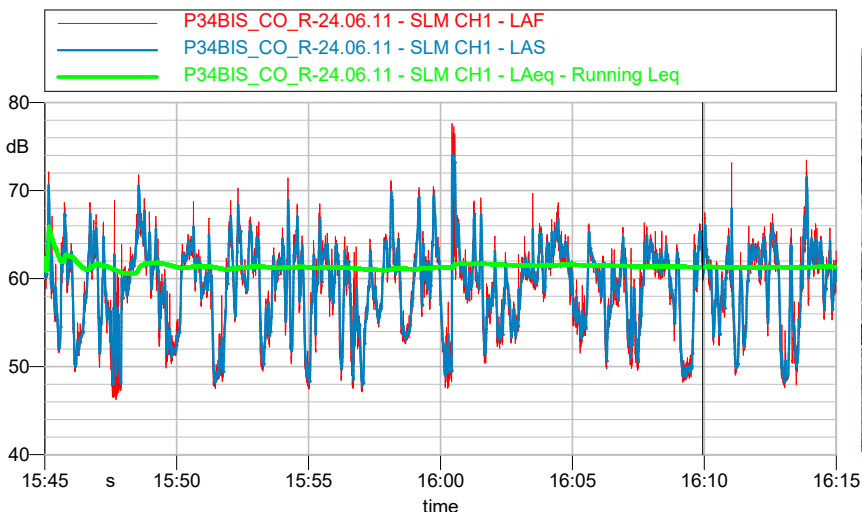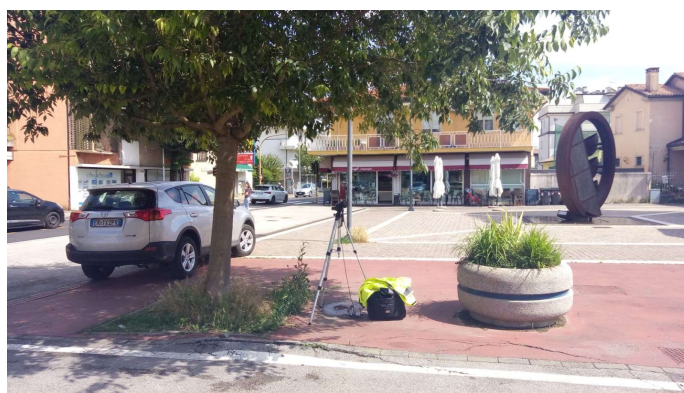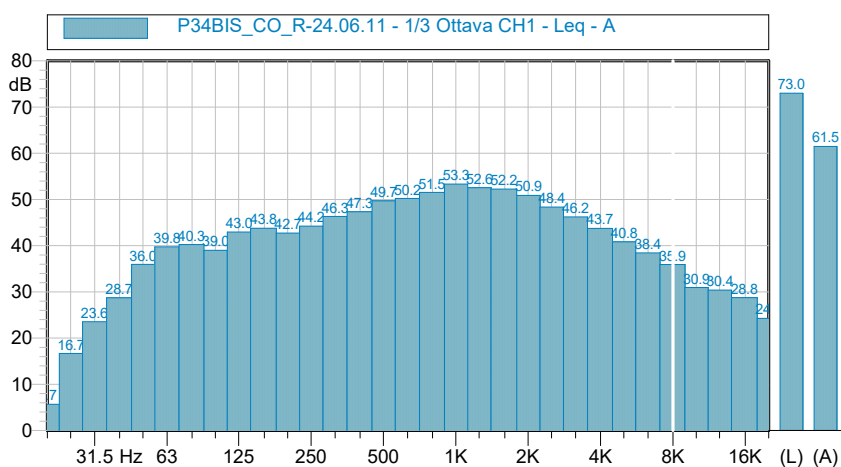

VALORE ANTE OPERA

**LAeq**  
**70 dBA**

valore estratto da modelli  
di studio del clima acustico

VALORE CORSO  
D'OPERA MISURATO

**LAeq**  
**61.3 dBA**

LIMITE DI ZONA

**CLASSE IV**  
**65 dBA**

NOTE
