

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P08TER_CO_R-24.06.27**

Posizione

Via Morgagni civ.40

Data mis.: 27/06/2024

Ora inizio: 11:40:42

Ora fine: 12:42:35

Durata: 3713.5 sec

Microcantiere: **D1**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 27°C

Precipitazioni: /

Umidità: 60%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 68.3dBA

Max = 86.3dBA

L50 = 61.0 dBA

Min = 44.3 dBA

L10 = 71.3 dBA



L95 = 49.2 dBA

Attività di cantiere: **nessuna**

Eventi generati dal cantiere: **passaggio macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

P08TER_CO_R-24.06.27 - 1/3 Ottava CH1 - Leq - A

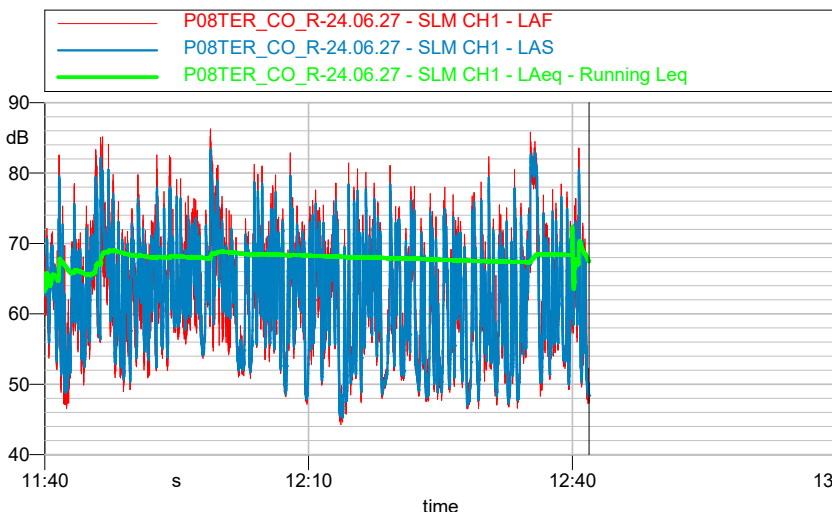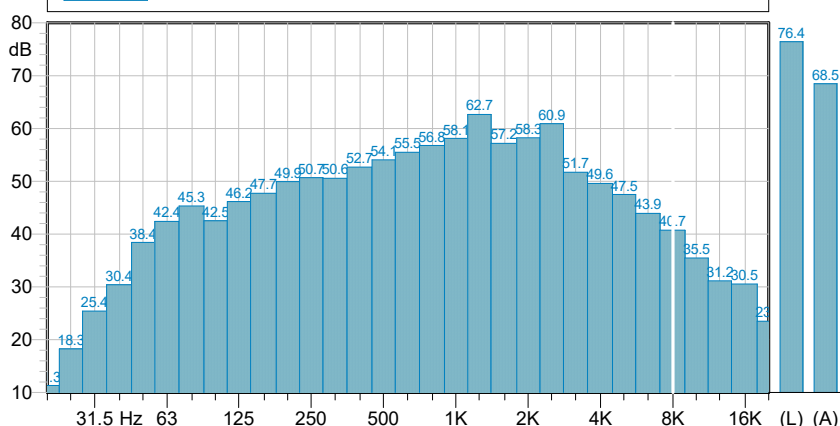

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
68.3 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
